

**ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ವಿಜಯಪುರ.**



**2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ**

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವಿಜಯಪುರ

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2022-23

(ದಿನಾಂಕ: 01-04-2022 ರಿಂದ 31-03-2023 ರ ವರೆಗೆ)

I ಪೀಠಿಕೆ:

ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ [ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು] ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987ರ ಕಲಂ.1 (3) ರನ್ವಯ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಎಚ್‌ಯುಡಿ/188/ಟಿಟಿಪಿ/1988 (3) ದಿನಾಂಕ:02-06-1988 ರನ್ವಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:11-06-1988 ರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊಂದಲು ಮಹಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳಗೊಂಡ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಠಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಠಿಯಾದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

II ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಚನೆ :

- (1) ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:11-06-1988 ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಆಯುಕ್ತರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು (1) ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, (2)ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, (3) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಇರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- (2) ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಶಾಖೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- (3) ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಗೆ ನಗರಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು ಅವರು ಯೋಜನಾ ರೂಪರೇಶಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

(4) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಇದ್ದು ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುವುದು.

ಅ.1	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರಿ ಗೊಳಸಂಗಿ,	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	01-04-2022	ರಿಂದ	14-1-2023
2	ಡಾ ಫ್ಲಿ.ಬಿ.ದಾನಮ್ಮನವರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	16-01-2023	ರಿಂದ	17-3-2023
3	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ವಿ.ರಜಪೂತ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	17-03-2023	ರಿಂದ	31-3-2023
4	ಡಾ ವಿ.ಬಿ.ಅಜಾರ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಆಯುಕ್ತರು	01-04-2022	ರಿಂದ	04-5-2022
5	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ ಮೆಕ್ಕಳಕೆ,ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ (ಆಯುಕ್ತರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಹುದ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)	ಆಯುಕ್ತರು	04-05-2022	ರಿಂದ	27-7-2023
6	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೋಮನಾಳ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್	ಆಯುಕ್ತರು	27-07-2022	ರಿಂದ	31-3-2023

(ಅ) ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾಯೋಜನೆ :

➤ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ-2031 (ಪ-2)

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/325/ಬೆಮಪ್ರಾ/2006 ದಿನಾಂಕ:07-12-2006 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಹಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/95/ಬೆಮಪ್ರಾ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:05-02-2019 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ-2031 (ಪ-2) (Master plan 2031) (R-2) ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ-1961 ಕಲಂ. 13(1) ರನ್ವಯದ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಹಾಯೋಜನೆ-2031 (ಪ-2) ರ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13/12/2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 29 ಬೆಮಪ್ರಾ 2022 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:26-04-2022 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ -2031 ಪರಿಷ್ಕೃತ-2 ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ GIS

ಆಧಾರಿತ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಪಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ನಕ್ಷೆ (Base Map) ಹಾಗೂ ಭೂ-ಉಪಯೋಗ ನಕ್ಷೆ (Land Use Map) Geographical Information System (GIS)

ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: DTCP/243/MISC/2017-18 ದಿನಾಂಕ:04-09-2020 ರ ಪ್ರಕಾರ Formulation of GIS based Master plan for phase-2, Package-5 for Vijayapura, Bagalkot and Badami ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ GIS ಆಧಾರಿತ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು M/s Rudrabhishek Enterprises Limited, New Delhi -110 001 ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:21-10-2020 ರಂದು ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. GIS ಆಧಾರಿತ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:-01-09-2022 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (M/s Rudrabhishek Enterprises Limited) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ Base Map ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ನಕ್ಷೆ (Existing Land Use Map) ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (Data) ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ :

01-04-2022 ರಿಂದ 31-03-2023 ರ ವರೆಗಿನ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚವು

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. (ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಯುಡಿಡಿ:4:ಟಿಟಿಪಿ:2019, ದಿ:01-03-2019)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಆದಾಯದ ವಿವರ	ಮೊತ್ತ	ಕ್ರ.ಸಂ	ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ	ಮೊತ್ತ
1)	ನಿಧಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಯೋಜನೆ:	87502618.00	1)	ನಿಧಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಯೋಜನೆ:	22047593.00
	ಆರಂಭದ ಶಿಲ್ಕು	127095980.00		ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	192551005.00
	ಒಟ್ಟು	214598598.00		ಒಟ್ಟು	214598598.00

III. ಈ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ :

(ಅ) ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು:

ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 143 ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-2 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚೈನಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್/ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ (ಹೈಮಾಸ್ಪ) ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 32 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.4,79,32,000/-ಗಳು. ಇದ್ದು ಸದರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,71,92,031/- ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಅ. ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
ಬಯಲು ಜಾಗೆ/ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ / ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.				
1.	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ರ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಹಾಕುವುದು.	2165000.00	2089882.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2.	ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಗಡಗಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಜೈಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ರಪೇರಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಮೆಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1925000.00	1909060.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	265000.00	261072.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗಿರೀಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	220000.00	158081.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಹಾಲಬಾಗಾಯತ ಗ್ರಾಮದ ಆಕೃತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಯಲುಜಾಗೆಗೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	180000.00	174819.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	110000.00	105904.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ಸಂಖ್ಯೆ: 8/ಕ ರ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:37 ಬರುವ ಬಯಲುಜಾಗೆಗೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	1190000.00	785253.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8.	ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಕಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1105000.00	754425.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9.	ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ಸಂಖ್ಯೆ: 56/ಬ ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2499000.00	1932550.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10.	ವಾ.ನಂ.29ರ ಮಣೂರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	615000.00	425452.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಸಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಯಲುಜಾಗೆಗೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	1608000.00	1293705.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12.	ವಾ.ನಂ.35 ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2492000.00	1662192.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಯಲು ಜಾಗೆ/ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್/ ಪುಟಪಾತ್ ಮಾಡುವುದು.

13.	ಪ್ರಾದಿಕಾರದ ವಿವೇಕ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ ಫಾರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2205000.00	2130882.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ಸಂಖ್ಯೆ: 8/ಕ ರ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:37, ರಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.	1435000.00	1028625.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15.	ವಾ.ನಂ.35 ಕುಲಕರ್ಣಿ ಲೇಔಟಿಟ (ನರಸೀಂಹ ನಗರ) ಸರ್ವೆ.ನಂ.747/ಬಿ ದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.	2410000.00	1535129.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16.	ದೇವಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2499000.00	1701861.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17.	ಸಾಯಿ ವಿಹಾರ (ಬಗಲಿ ಮಂಗಕಾರ್ಯಲಯ ಹಿಂದುಗಡೆ) ಗಾರ್ಡನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2460000.00	1788323.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18.	ರಿ.ಸ.ಸಂಖ್ಯೆ: 37/ಅ/3 ರ ವಾ.ನಂ.35 ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಯಲುಜಾಗೆ ಯೋಗಾ ಪ್ಲಾಟ ಫಾರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1335000.00	741621.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19.	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ರ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಲೇಔಟಿಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.	2225000.00	1427160.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ / ಮಿನಿಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

20.	1)ಕೆ.ಸಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ 2) ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ರಿ.ಸ.ನಂ.96 ರ, ಲೇಡಿಜ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 3) ರಾಜಪುತ ಗಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ 4)ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಆವರ್ಣದಲ್ಲಿ, 5) ಎಸ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.891 ರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 6) ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ 7) ಮಧಬಾವಿ ಎಲ್.ಟಿ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1300000.00	1128203.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21.	1) ರಿ.ಸ.ನಂ:838 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ, 2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 ರ ರಾಣೀ ಬಗಿಚಾ, ಮಂಗವಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ	2360000.00	1841426.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.


	ಭವನ ಹತ್ತಿರ 3) ಹೊಸ ಐ.ಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 4) ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.49 ರಲ್ಲಿ 5) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.01 ನೆಹರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ 6) ಸನ್ ಸಿಟಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ, 12.00/12.50 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.			
22.	ನಗರದ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 20.00 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	500000.00	424202.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23.	1)ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬಾಲಿಕೆಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2)ಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಣಿ ಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, 3) ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, 4)ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, 5) ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ಐ.ಟಿ ಕಾಲೇಜು ಯದುಗಡೆ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ 6) ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಹಾಗೂ 7) ನೀಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1300000.00	946344.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24.	1)ಭಾವಸಾರ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಭಾಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, 2) ಸುಂದರೇಶ್ವರ ದೇವ ಸ್ಥಾನ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಓಣಿ ಸ್ವೇಶನ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, 3) ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, 4) ಮ.ಬಾ. ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ಸಂ:945/ಇ ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಣೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ, 5) ಅಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 6) ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಲೇಡಿಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 12.00/12.50 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2360000.00	1707083.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25.	1. ಪೋಲಿಸ್ ಚಿಂತನ್ ಹಾಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. 2.ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ವಸತಿಗೃಹ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. 3. ಪೋಲಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ. 12.00/12.50 ಮೀ. ಎತ್ತರದ 3 ಹೈಮಾಸ್ಪ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.	1230000.00	1043690.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

26.	1)ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅವರಣದಲ್ಲಿ, 2) ಶಹಪೇಟೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕತ್ತಿ ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ, 3) ಟಕ್ಕೆ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, 4) ಮಠಪತಿ ಗಲ್ಲಿ (ನಾವಿ ಗಲ್ಲಿ) ವಿಠಲ್ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, 5)ಶಹಪುರ ಅಗಸಿ, ಕಲಾಲ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	930000.00	862558.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27.	1) ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಟಾಲಿಯನ್ (ಆರ್.ಬಿ.ಐ) ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ, 2) ವಾ.ನಂ.16 ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸ್ಟಾರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, 3) ಚವಾಹನ ವಸತಿ ಭೂತನಾಳ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ, 4)ಗಜ್ಜಿನಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಳೆ ಫರ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ 16.00 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1730000.00	1290718.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28.	1) ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಮುನೀಶ್ವರ ಬಾಗ ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ - ಎರಡು (2) ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳು, 2) ವಾ.ನಂ.16 ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರೀ.ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, 3) ವಾ.ನಂ.16 ಯೋಗಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, 4) ವಾ.ನಂ.12 ರ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ 12.00/12.50 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1965000.00	1343904.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ				
29.	Development of Lawn in VUDA Vivek Nagar West Garden.	2499000.00	2136807.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗೋದಾವರಿ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್‌ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	550000.00	541874.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31.	Repairing, Painting & Water Proofing At VUDA Commissioner, AE & Office Staffs Quarters.	800000.00	555237.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32.	1)ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, 2) ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆಚೇರಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಸ್‌ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1465000.00	1463989.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	47932000.00	37192031.00	

ಬಯಲು ಜಾಗೆ/ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್/ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.



ಅ.ನಂ 2. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಗಡಗಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ರಪೇರಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಮೆಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

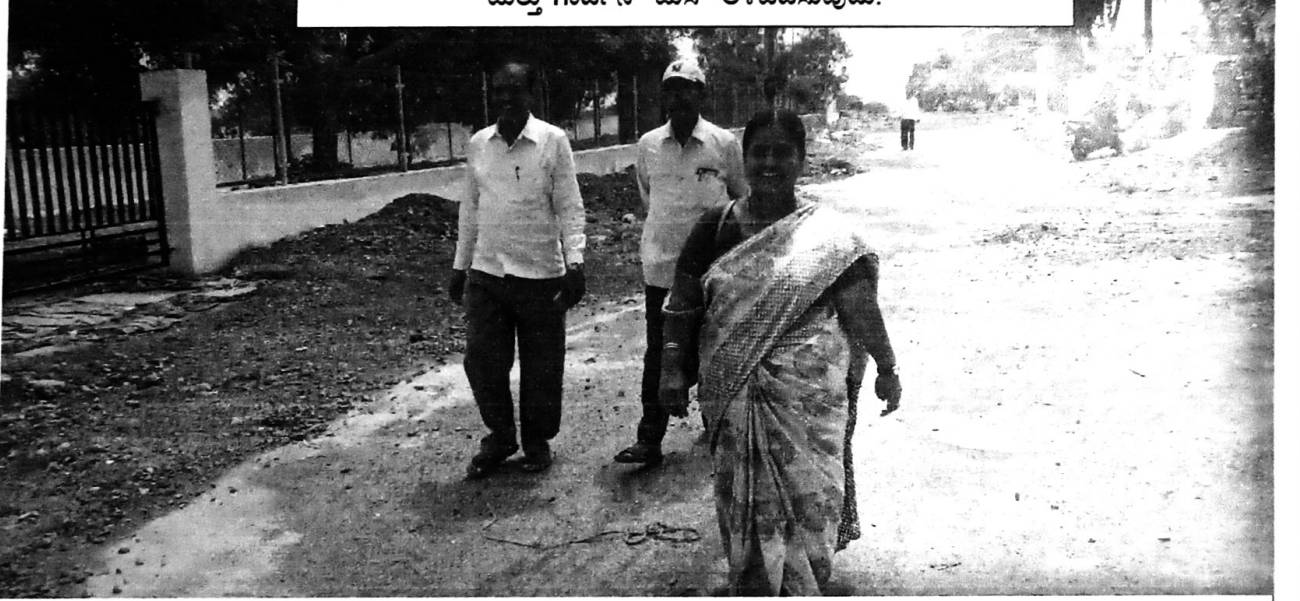


ಅ.ನಂ.1, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ರ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಹಾಕುವುದು.




ಅ.ನಂ.10, ವಾ.ನಂ.29ರ ಮೂರನೇ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.



ಅ.ನಂ.1 ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ರ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಹಾಕುವುದು.

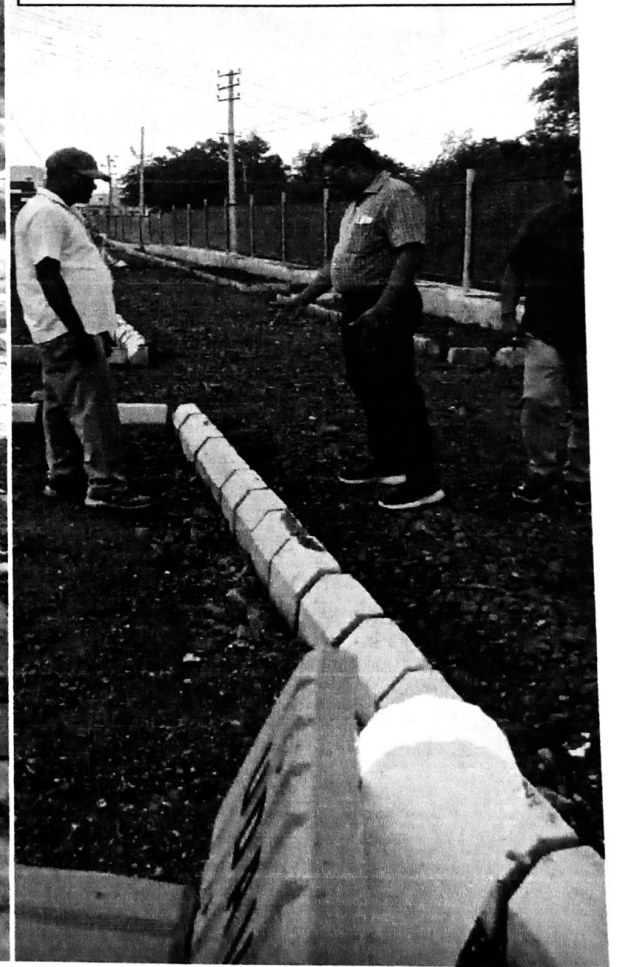

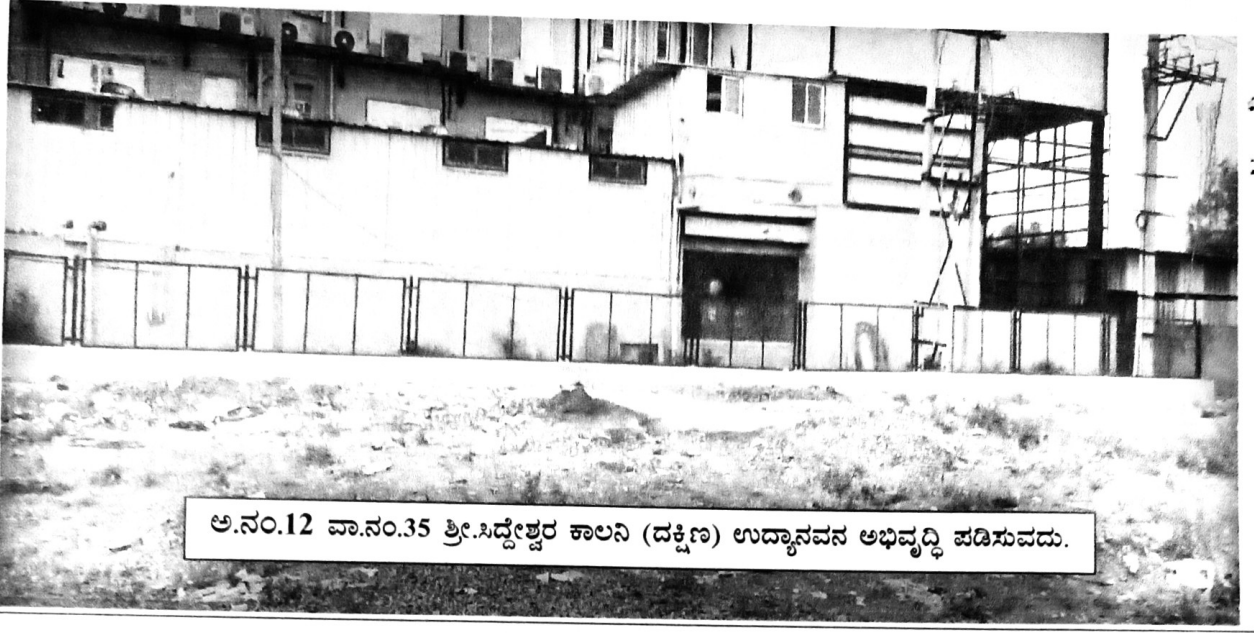

ಅ.ನಂ.12 ವಾ.ನಂ.35 ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

ಬಯಲು ಜಾಗೆ/ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್/ಪುಟಪಾತ್ ಮಾಡುವುದು.




ಅ.ನಂ.16 ದೇವಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

10/2/22
11:44 AM


ಅ.ನಂ.19 ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ರ ಅಗ್ನಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಲೇಡಿಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.



ಅ.ನಂ.17 ಸಾಯಿ ವಿಹಾರ (ಬಗಲಿ ಮಂಗಳಾರ್ಯಾಲಯ ಹಿಂದುಗಡೆ) ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

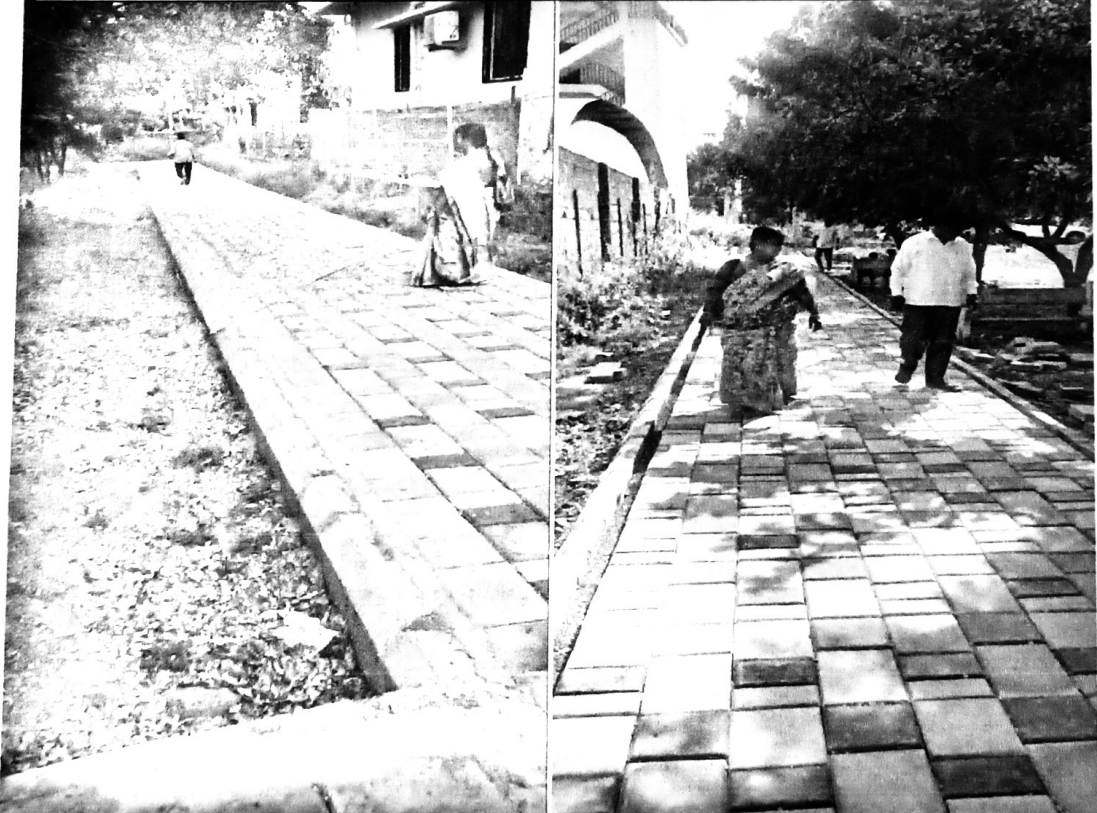

ಅ.ನಂ.15 ಸರ್ವೆ.ನಂ.747/ಬಿ ದಲ್ಲಿ ವಾಕೀಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.

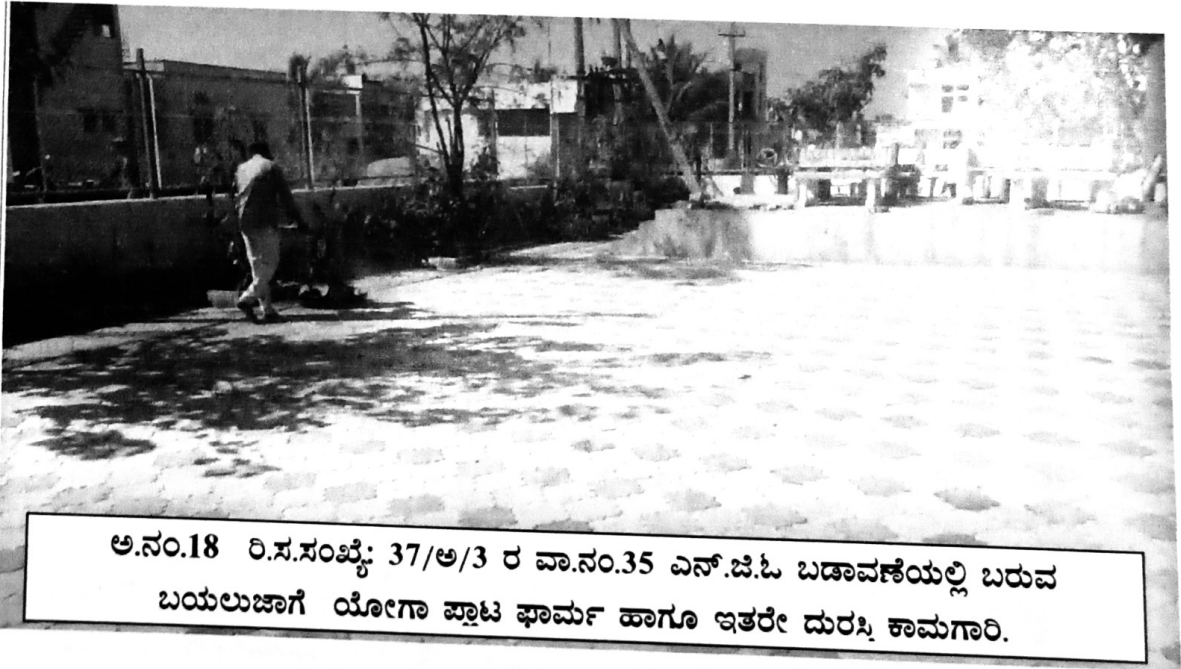

ಅ.ನಂ.18 ರಿ.ಸ.ಸಂಖ್ಯೆ: 37/ಅ/3 ರ ವಾ.ನಂ.35 ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಯಲುಜಾಗೆ ಯೋಗಾ ಪ್ರಾಟ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.

ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ / ಮಿನಿಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.




ಅ.ನಂ.27 ಚವಾಕನ ವಸತಿ ಭೂತನಾಳ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ 16.00 ಮೀ.
ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ



ಅ.ನಂ.27 ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ವ ಬಟಾಲಿಯನ್ (ಆರ್.ಬಿ.ಐ) ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ
16.00 ಮೀ.ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಅ.ನಂ.27 ಗಟ್ಟಿನಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಳಿ ಫರ್ಶಿ ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ 16.00
ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.

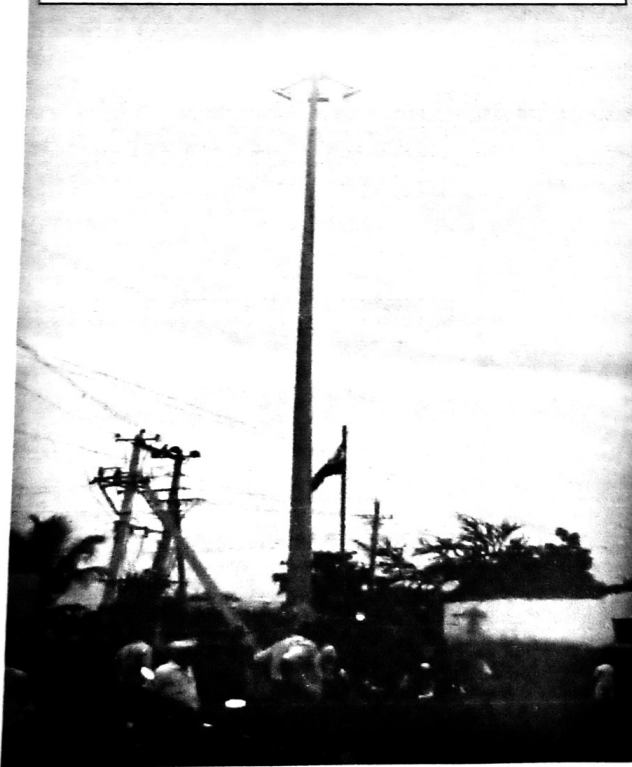

ಅ.ನಂ.27 ವಾ.ನಂ.16 ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸ್ಟಾರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, 16.00 ಮೀ.
ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.



ಅ.ನಂ.26 ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ.ಕಾಮಗಾರಿ.



ಅ.ನಂ.26 ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ.ಕಾಮಗಾರಿ.

I. ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ




S.L.31 Repairing, Painting & Water Proofing At VUDA Commissioner, AE & Office Staffs Quarters.




S.L.31 Repairing, Painting & Water Proofing At VUDA
Commissioner, AE & Office Staffs Quatars.

ಅ.ನಂ.32 ಸರಕಾರಿ ಆಸತೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಬಸ್‌ಶೆಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.



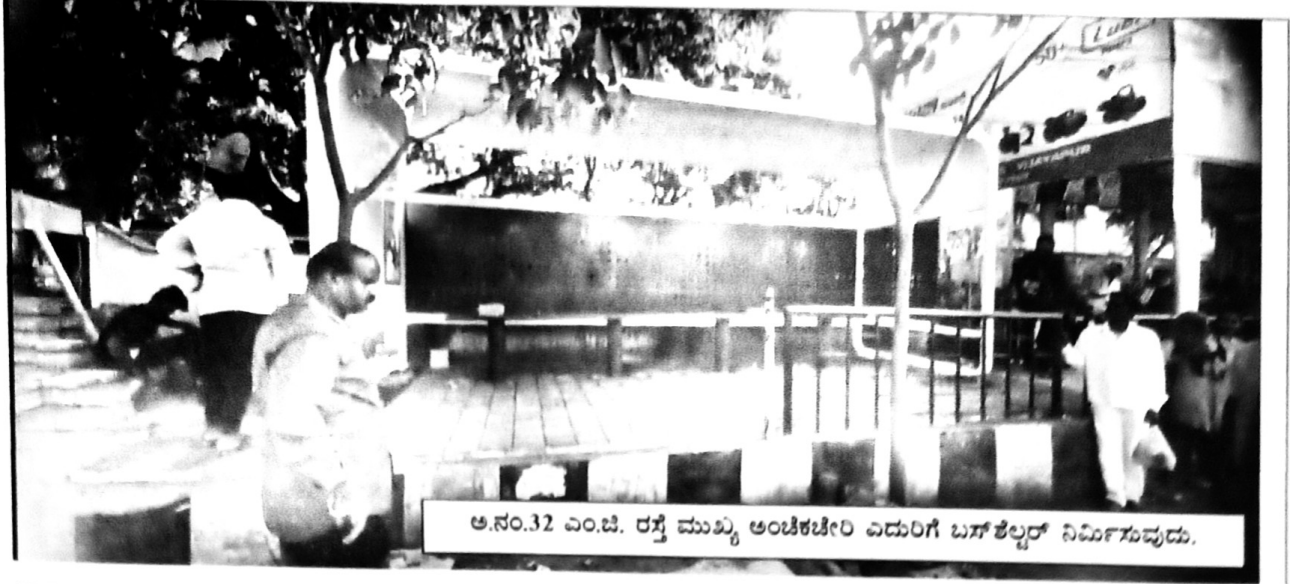

ಅ.ನಂ.32 ಎಂ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆಚೀರಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಸ್‌ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

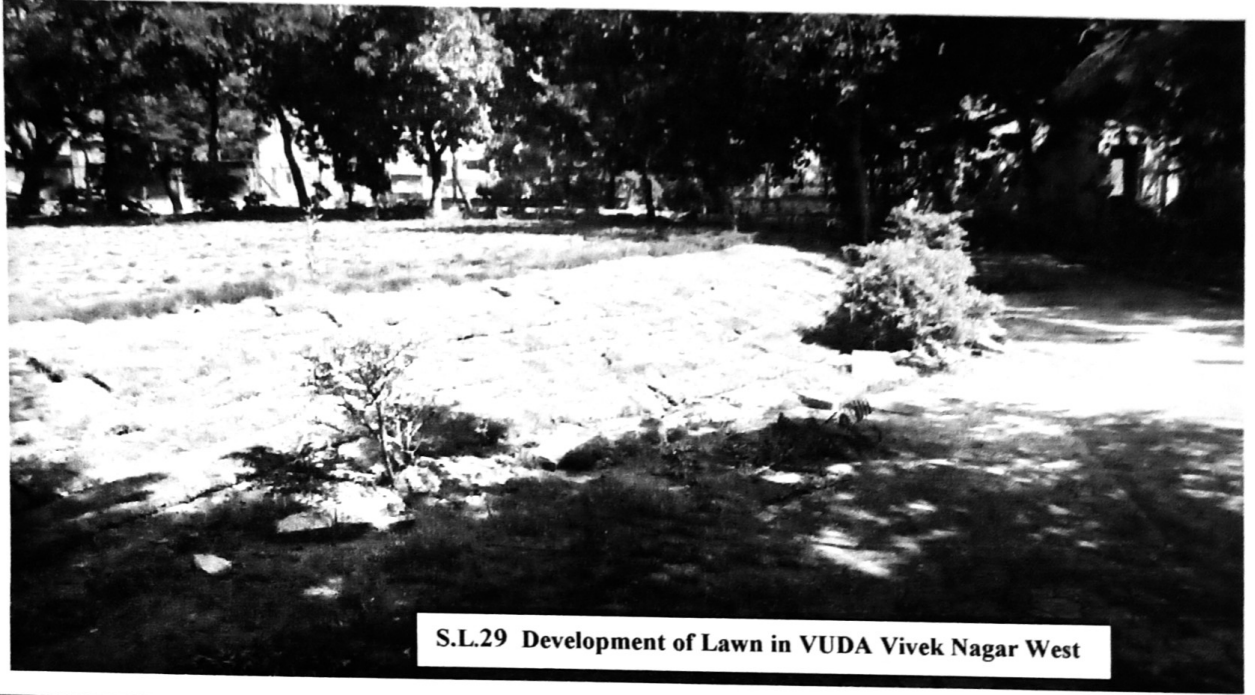

S.L.29 Development of Lawn in VUDA Vivek Nagar West

IV ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ರೋಢಿಕರಣ : 1) ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ):

(ಅ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯ ವಿವರ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು 99 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ (ದಿನಾಂಕ:01-04-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31-03-2023 ರ ವರೆಗಿನ ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ)ಯ ವಿವರವು ಈ ಕೆಳಗನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ:	ಒಟ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳು	ದಿ: 01-04-2022 ರಿಂದ ದಿ: 31-03-2023 ರ ವರೆಗಿನ ಬೇಡಿಕೆ	ವಸೂಲಿ	ಬಾಕಿ
1	99	37,57,279=00	12,77,202=00	24,80,076=00

(ಆ) ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ: ದಿನಾಂಕ:01-04-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31-03-2023 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು :28 ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1991 ರನುಸಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ) ವಿವರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ:	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನಗಳು	ದಿ: 01-04-2022 ರಿಂದ ದಿ: 31-03-2023 ರ ವರೆಗಿನ ಬೇಡಿಕೆ	ವಸೂಲಿ	ಬಾಕಿ
1	10	2,91,11,500=00	2,73,37,400=00	17,74,100=00

1	ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ನಿಧಿ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
---	-------------------	-----------------

V. 2022-23ರ ಆಯವ್ಯಯ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ	ವಾಸ್ತವಿಕ
1	ಒಟ್ಟು ಜಮಾ	13,53,50,000=00
3)	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	8,20,00,000.00
		2,20,47,593.00

VI) ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನದ ಬೇಲೆ ಶೇ.25.00 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶೇ.10.00 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಶೇ 3.00 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗಳ) ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು 1991 ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

VI) ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ/ಪ್ರಶಸ್ತಿ:

ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ನೇರ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ರೂಪರೇಷಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

VII) 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರಿ:

ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 50:50 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-

ಆಯುಕ್ತರು,

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವಿಜಯಪುರ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವಿಜಯಪುರ

ಕ್ರಮ	ವರ್ಷವಾರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ವರ್ಷವಾರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದರೆ	ಅವುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022-2023	ಮಾರ್ಚ್ 2023	2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುದ್ರಣ ವಿಳಂಬ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಹಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.	ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ:- 03-10-2023 ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ:- 30-10-2023	2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ 100 ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 280 ಸಿ.ಡಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುದ್ರಣ ವಿಳಂಬ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಹಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.	-

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು,
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವಿಜಯಪುರ

ENGLISH

**URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
VIJAYAPUR**



**2022-23
ANNUAL REPORT**

Urban Development Authority, Vijayapura

Annual Report 2022-23

(Date: 01-04-2022 to 31-03-2023)

I) Introduction :

Vijayapur Urban Development Authority was Contituted for the Planned Development of Vijaypur city and adjoining areas as per the Section 3(1) of Urban Development Authorities act 1987 vide goremment order No:HUD/188/TTP/1988. It come in to existence w.e.f dt: 11-06-1998 Mainly the objectives of the authority is to (1) prepare development schemes, creating plots distribute the plots and to (2) to prepare the master plan for area under the jurisdiction of the authority (VIJAYAPUR LOCAL PLANNING AREA) focusing on the residential, commercial, industrial, transport & communication, open spaces and identifying the developed areas (3) Giving opinion to Deputy Commissioner for conversion of Agricultural to Non Agricultural lands with in jurisdiction of the authority (LPA) (4) and approval of layouts with in jurisdiction of the authority (LPA) as per KTCP Act 1961, KUDA 1987, Zonal Regulations of Master Plan and Order/Circulars of the Government.

II) Administrative Structure :

- 1) Vijayapura Urban Development Authority came into existence on 11-06-1988. The Authority has a Governing Body consists of a Chairman and five members nominated by the Government. Their term of office will be for three years. The Authority shall have one Commissioner. There are three divisions in the Authority (1) Administrative Branch, (2) Planning Branch (3) Technical Branch each of which is headed by a Commissioner.
- 2) The Administrative Branch shall have an Accounts Section which shall function as directed by the Commissioner.
- 3) The Planning Branch is headed by Town Planning Member in which they prepare layouts proposals and present them before the General Body meeting through the Commissioner and approve the layouts as directed by the Body.
- 4) The Technical Branch is headed by Assistant Executive Engineer in which they prepare an action plan for the works to be undertaken under the authority and present it before the General Body meeting through the Commissioner and carry out the works as per the estimate papers as per the direction of the Body.

The details of the president and commissioners who worked in the year 2022-2023 are as follows.

Slno					
1	Shri Srihari Golasangi,	President	01-04-2022	From	14-01-2023
2	Dr. V. B. Danammanavara, I.A.S	President	16-01-2023	From	17-03-2023
3	Shri. P V Rajput	President	17-03-2022	From	31-03-2023
4	Dr.V.B.Ajur K.G.S	Commissioner.	01-04-2022	From	04-05-2022
5	Mr.Vijaya Mekhkaleki. K.M.A.S.(In-Charge)	Commissioner	04-05-2022	From	27-07-2023
6	Shri. S.S. Somanala K.A.S	Commissioner	27-07-2022	From	31-03-2023

(A) Preparation of Master Plan for Vijayapur Local Planning Area.

- The MASTER PLAN for Vijayapur Local Planning Area Master Plan-2021 (Revision-1) is approved by the government as per the Government Order No:Nae 325 Bemapra 2006 Dated: 07-12-2006.
- The revised Master Plan-2031 (Revision-2) is submitted for the provisional approval of the Government. As per KTCP Act 1961 Sec 13(1) the Government approved the Provisional Master Plan-2031 (Revision-2) bearing Government Order No: Nae 95 Bemapra 2018 Dated: 05-02-2019.
- Further the proposal for final approval of Master Plan-2031 (Revision-2) is submitted to Government through Director, Town & Country Planning Department on 13-12-2021. And government have approved the Final Master Plan-2031 (Revision-2) bearing Government Order No. Nae 29 Bemapra 2022 Bangalore Dated: 26-04-2022.

(B) Preparation of GIS based Master Plan for Vijayapur Local Planning Area under AMRUT Scheme.

- Government Of INDIA started a Scheme called AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) to prepare GIS based Master Plan. The Base Map and Land Use Map is prepared in GIS format using high resolution satellite images. Work order is issued on 21-10-2020 to M/s Rudrabhishek Enterprises Limited, New Delhi-11001 for preparation of GIS based Master Plan for Phase-2 Package-5 for Vijayapura, Bagalkot and Badami Local Planning Areas through Director, Town & Country Planning Department, Bangalore. Various information is collected from different departments and Base Map is prepared and submitted to Director, Town & Country Planning Department, Bangalore. Preparation of Existing Land Use Map (ELU) and Proposed Land Use Map is in process.

(C) Details of Administrative Expenses :

(1) Brief details of income and expenditure from 01-04-2022 to 31-03-2023 are as follows.
(Government Circular No: UDD:4:TTP:2019, Dated:01-03-2019)

Sl. No	Particulars	Amount	Sl. No	Particulars	Amount
1	Fund : General Administration and Master Plan	87502618.00	1	Fund : General Administration and Master Plan	22047793.00
	Opening Balance	127095980.00		Closing Balance	192551005.00
	Total	214598598.00		Total	214598598.00

III) Progress so far:

A) Details of Private Layouts approved Total 143 Private Layouts is approved in Vijayapur during the year 2022-23

A total of 32 works have been undertaken in Vijayapur Urban Development Authority in Development Project-2 including Park, Development, Chainlink Fencing/ Walking Track, Various Barangays (Highmasta) with an estimated Amount of Rs.4,79,32,000/-s. All works will be completed accordingly. Its total cost is Rs. 3,71,92,031/- The details of the works are shown in the table below

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost	Expenditure	Progress Status
Chain Link Fencing/ Walking Track Works for Open Space / Garden.				
1.	Construction of Compound wall & RCC Chairs to open space in W.No.17 at Agri Gold Badawane & Bannad Layout.	2165000.00	2089882.00	Work Completed.
2.	Providing and fixing Compound wall with fencing work at Siddeshwar Gadagi Layout near Shri.Jai Hanuman Temple.	1925000.00	1909060.00	Work Completed.
3.	Development of Garden work in Sangmeshwar Colony.	265000.00	261072.00	Work Completed.
4.	Development of Garden work in Girish Nagar.	220000.00	158081.00	Work Completed.
5.	Providing and fixing Chain Link Mesh to open space in Akruiti Colony, Mahalbagayat.	180000.00	174819.00	Work Completed.
6.	Development of Garden work in Siddeshwar Housing Colony.	110000.00	105904.00	Work Completed.
7.	Providing And Fixing Chain Link Mesh To Garden Space In Sy.No.8/C, Plot No.37 At Kasaba.	1190000.00	785253.00	Work Completed.
8.	Balance Garden Development work at Sy.No.46/A of Bankars Colony.	1105000.00	754425.00	Work Completed.
9.	Development of Garden in Sy.No.56/B.	2499000.00	1932550.00	Work Completed.
10.	Development of Garden at W.No.29 Mannur Colony.	615000.00	425452.00	Work Completed.
11.	Providing and fixing chain link mesh to open space in K.C.Nagar.	1608000.00	1293705.00	Work Completed.
12.	Development of Garden in W.No.35 Sri.Siddeshwar Colony (South Side).	2492000.00	1662192.00	Work Completed.

Construction of Walking Track & Footpath in Open Space / Garden				
13.	Repairing Of Stadium Platform & Others At Vivek Nagar West Garden.	2205000.00	2130882.00	Work Completed.
14.	Providing Walking Track In Sy.No.8/C, Plot No.37 At Kasaba.	1435000.00	1028625.00	Work Completed.
15.	Providing Walking Track To Open Space In Narsiva Nagar, W.No.35 Kulkarni Layout R.S.No.747/B.	2410000.00	1535129.00	Work Completed.
16.	Development of Garden in Devki Nagar.	2499000.00	1701861.00	Work Completed.
17.	Development of Garden in Sai Vihar (Bagali Function Hall Back Side).	2460000.00	1788323.00	Work Completed.
18.	Construction of Yoga Platform & Other Works to N.G.O Colony Garden at R.S.No.37/A/3 in W.No.35.	1335000.00	741621.00	Work Completed.
19.	Providing walking track to open space in W.No.17 at Agri Gold Badawane & Bannad Layout.	2225000.00	1427160.00	Work Completed.
Providing High Mast/Mini Mast Light in Vijaypur City.				
20.	Providing & Fixing Mini Mast Pole At 1) K.C.Nagar 2) Ashram Road Sy.No.96 Garden Near Ladies Hostel 3) Rajput Galli Indi Road 4) Managoli Road At Graveyard Compound. 5) S.R. Colony Sy.No.891 Garden. 6) Sai Park Garden. 7) Madbhavi LT Bhavikatti Tanda.	1300000.00	1128203.00	Work Completed.
21.	Construction of 12/12.50 Mtr High mast Pole at 1) W.No.4 Sy.No.838/C NGO colony Opposite NGO office Darga Road 2) Near New Samudya Bhavan in Mangwadi Colony at W.No.14 Rani Bagicha. 3) New I.B Premises. 4) Govt Kannada Higher Primary School No.49. 5) Nehru Nagar W.No.01. 6) Sun city Back Side of Akruti Layout Garden, Solapur road.	2360000.00	1841426.00	Work Completed.

22.	Construction of 20Mtr High mast Pole in Uttradi Math Compound, Vijaypur.	500000.00	424202.00	Work Completed.
23.	Providing & fixing Mini mast Pole at 1) Ladies Government College Compound, 2) Takke road near Agni Shamak office Premises, 3) Adarsh Nagar Near Ganapati Temple, 4) Adarsh Nagar Near Hanuman Temple, 5) Chalukayya Nagar opsite I.T College near Ganapati Temple. 6) Darga road Near Laxmi Temple. 7) Nila Nagar.	1300000.00	946344.00	Work Completed.
24.	Construction of 12/12.50 Mtr High mast Pole at 1) Bhavasar Nagar garden compound near Ambabhavani Temple. 2) Sundreshwar temple near Haranshikari area road, 3) Near Adrash nagar Bus Stop, 4) Ganesh Nagar Garden at Sy.No.945/E of Mahalbagayat, 5) Allapur Tanda, 6) B.L.D.E Society near Ledies Hostel Ganapati Temple Garden.	2360000.00	1707083.00	Work Completed.
25.	Construction of 12/12.50 Mtr High mast Pole at 1) Police Chintal Hall, 2) Police Quarters at Athani road near Al-Ameen Hospital, 3) Garden of Police Head Quarters.	1230000.00	1043690.00	Work Completed.
26.	Providing & fixing Mini mast Pole at 1) Chalukayya Nagar, Brahma Kumari School Premises. 2) Shahapeti Near Ambabhavani Temple Katti Line. 3) Takke Near Hanuman Temple. 4) Matpath Galli (Navi Galli) Near Vithal Temple. 5) Shahapur Agsi at Kalal Galli.	930000.00	862558.00	Work Completed.
27.	Construction of 16 Mtr High mast Pole at 1) Indian Reserve Battalion (I.R.B), Arkeri. 2) W.No.16 Gandhi Nagar Near Star Chowk. 3) Chavan Residency Near Bhutnal Tanda. 4) Gacchinakatti Colony Near Bali Pershi Adde.	1730000.00	1290718.00	Work Completed.

28.	Construction of 12/12.50 Mtr High mast Pole at 1) Sidagi Road Muneshwar Bagh Near Ashram.2No 2) W.No.16 Gandhi Nagar Near Sri.Vithal Rukmani Temple. 3) W.No.16 Yogapur Colony Near Sangolli Rayanna Circle. 4) W.No.12 Akki Colony Near Balmare Temple.	1965000.00	1343904.00	Work Completed.
Other Works.				
29.	Development of Lawn in VUDA Vivek Nagar West Garden.	2499000.00	2136807.00	Work Completed.
30.	Providing & fixing of Fabricated Bus Shelter near Godavari Hotel.	550000.00	541874.00	Work Completed.
31.	Repairing, Painting & Water Proofing At VUDA Commissioner, AE & Office Staffs Quarters.	800000.00	555237.00	Work Completed.
32.	Providing & fixing of Fabricated Bus Shelter at 1) Govt Civil Hospital Opposite. 2) M.G road near Head post office Opposite.	1465000.00	1463989.00	Work Completed.
TOTAL:		47932000.00	37192031.00	

Chain Link Fencing/Walking Track Works for Open Space / Garden.



SL.No-2 Providing And Fixing Compound Wall With Fencing Work At Siddeshwar Gadagi Layout Near Shri.Jai Hanuman




SL.No-10 Development Of Garden At W.No.29 Mannur Colony.

SL.No-1 Construction Of Compound Wall & RCC Chairs To Open Space In W.No.17 At Agri Gold Badawane & Bannad Layout.





SL-11 Construction Of Compound Wall & RCC Chairs In Open Space In W.No.17 At Agri Gold Badavane & Bannad Layout

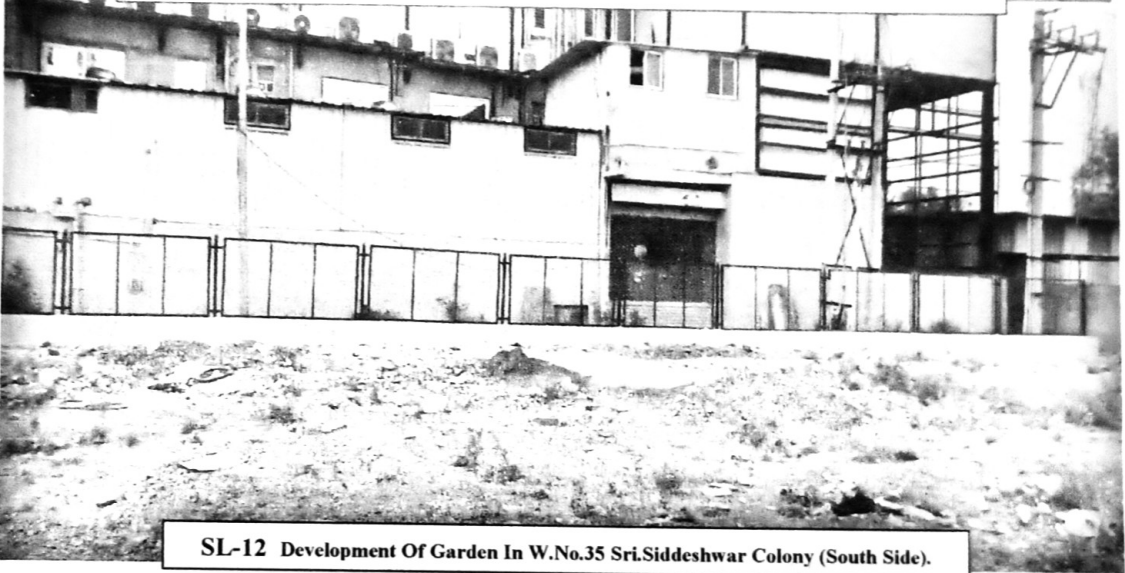

SL-12 Development Of Garden In W.No.35 Sri.Siddeshwar Colony (South Side).

Construction of Walking Track & Footpath in Open Space / Garden



S.L-16 Development Of Garden In Devaki Nagar.




**S.L-17 Development Of Garden In Sai Vihar
(Bagali Function Hall Back Side).**



**S.L-15 Providing Walking Track To Open Space In Narsimha
Nagar, W.No.35 Kulkarni Layout R.S.No.747/B.**



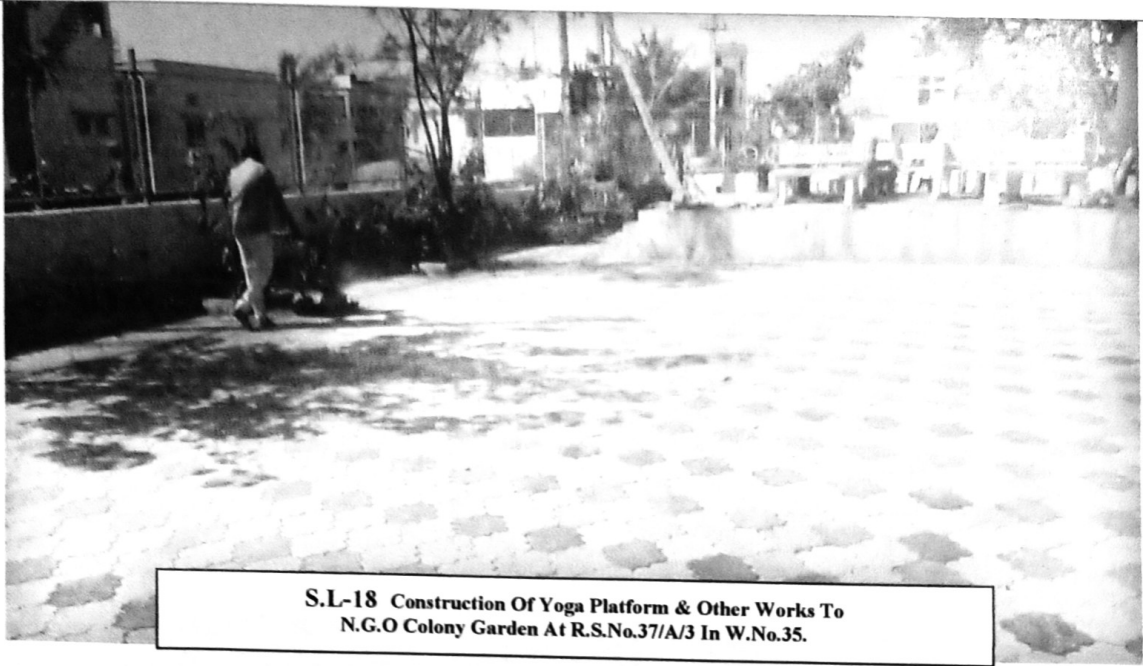

S.L-18 Construction Of Yoga Platform & Other Works To N.G.O Colony Garden At R.S.No.37/A/3 In W.No.35.

Providing High Mast/Mini Mast Light in Vijaypur City.



S.L-27 Construction Of 16 Mtr High Mast Pole At Chavan Residency Near Bhutnal Tanda.



S.L-27 Construction Of 16 Mtr High Mast Pole At 1) Indian Reserve Battalion (I.R.B), Arakeri.



S.L-27 Construction Of 16 Mtr High Mast Pole At Gachinakatti Colony Near Bali Parshi Adda.



S.L-27 Construction Of 16 Mtr High Mast Pole At W.No.16 Gandhi Nagar Near Star Chowk.


I. Other Works.





S.L-31 Repairing, Painting & Water Proofing At Vuda Commissioner, AE & Office Staffs Quarters.



**S.L-31 Repairing, Painting & Water Proofing At VUDA
Commissioner, Ae & Office Staffs Quaters.**

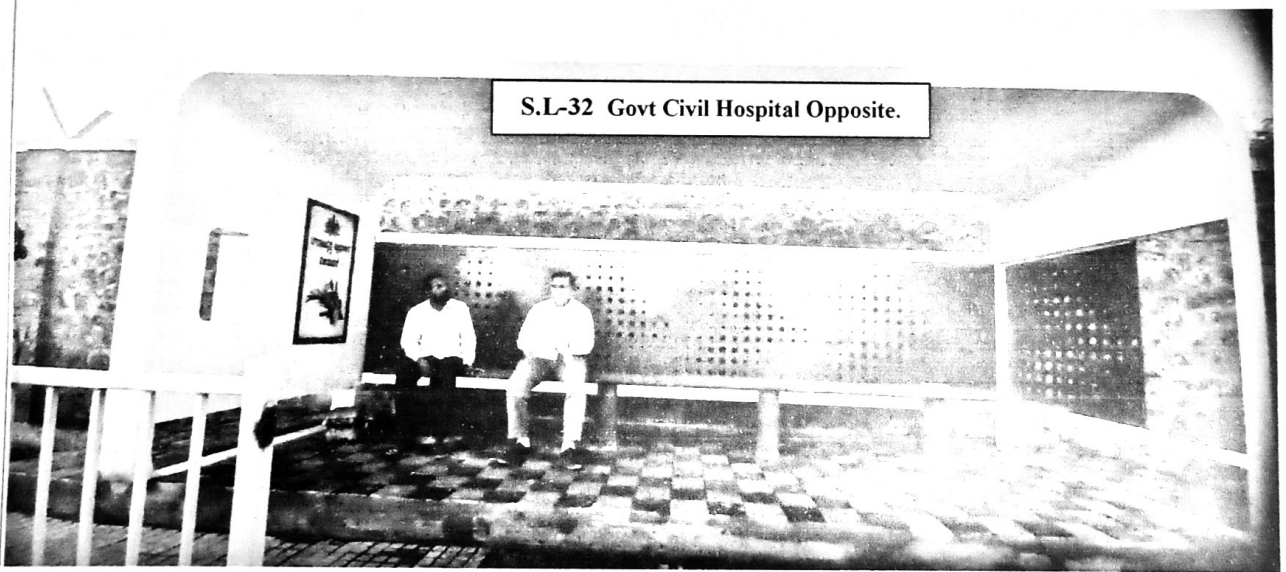

S.L-32 Govt Civil Hospital Opposite.

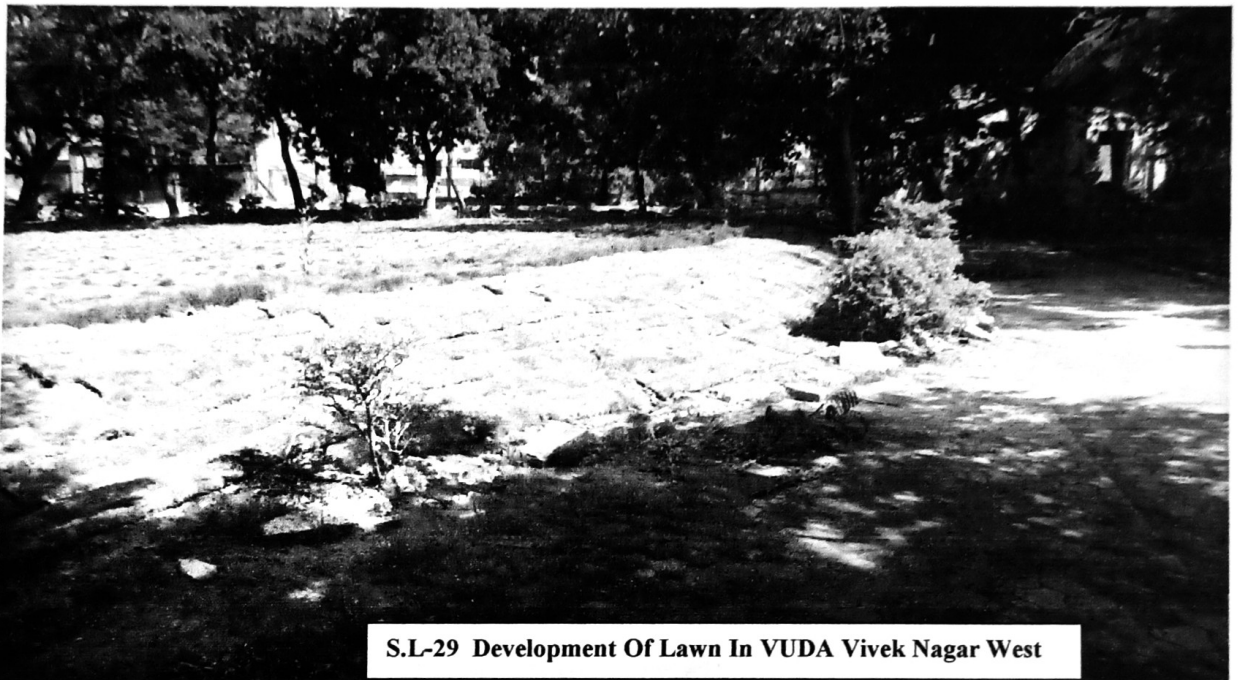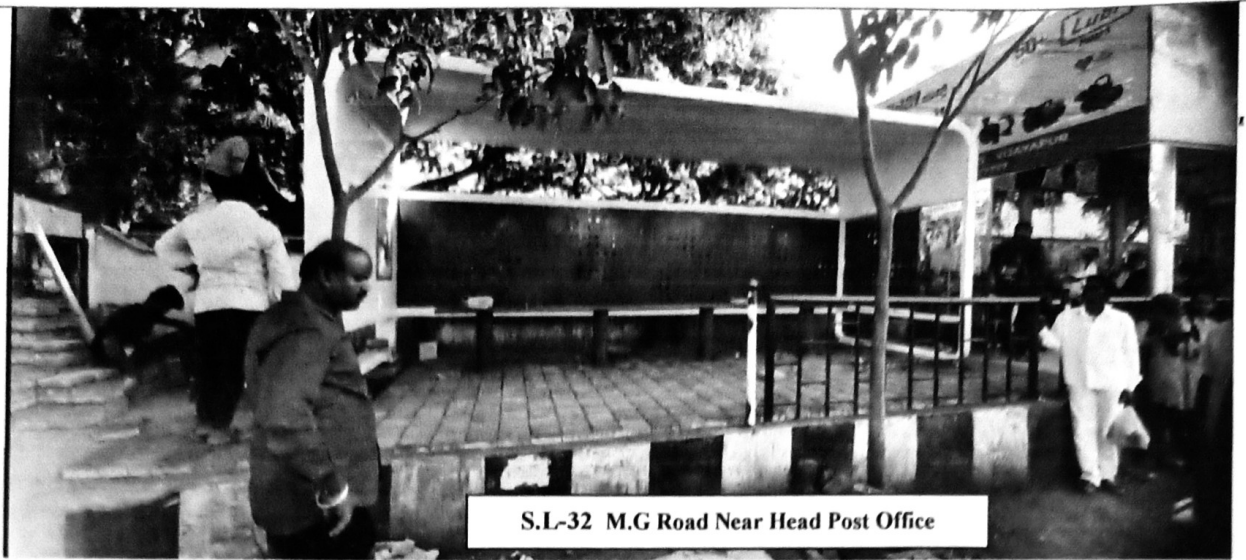

IV) Mobilization of Resources : 1) Demand, Collection and Balance List (DCB):

(A) Details of Rent of Commercial Shops A total of 99 commercial shops have been constructed by the Vijayapur Urban Development Authority for various uses and issued on a monthly license fee bases (on rent bases). The details of Demand, Collection and Balance Sheet (DCB) from the said stores (Date:01-04-2022 to Date:31-03-2023) are as follows.

Sl no	Total Shops	From 01-04-2022 to 31-03-2023	Amount Issued	Balance
1	99	37,57,279=00	12,77,202=00	24,80076=00

(B) Details of Allotment of Civic Amenity Sites:

During the period from Date:01-04-2022 to Date:31-03- 2023, a total of 28 civic amenity sites were allotted under the Karnataka Urban Development Authorities (Allotment of Civic Amenity sites) Rules, 1991 to Society or an associations, organizations, any charitable,educational,religious purpose and The government departments on a 30-year lease bases. The details of Demand Collection and Balance (DCB) during the period are as follows.

SL No	Total Shops	From 01-04-2022 to 31-03-2023	Amount Issued	Balance
1	10	2,91,11,500=00	2,73,37,400=00	17,74,100=00

1	Municipal Fund	Not Applicable
---	----------------	----------------

V) Income and Expenditure Statement as per Budget:

Sl.No	As per Budget		Actual
1	Total Income	13,53,50,000=00	8,75,02,618=00
2	Total Expenditure	8,20,00,000 = 00	2,20,47,593=00

VI) Welfare programmers:

In the housing scheme undertaken by the Authority, the Scheduled Castes will be allocated for the Economically Weaker Sections. The Karnataka Urban Development Authority (Plot Allotments) Allotment Rules, 1991 have been adopted by providing a discount of 3.00% for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and ex-servicemen out of the initial deposit of 10.00% required to be paid for plots with 25.00%. No plots are allotted in this row

VII) Special Achievement/Award:

As directed by the government, either through the participation of the farmers or through direct negotiation, the Land will be acquired and proposals will be prepared for the planning and approval of the Government will be taken to formulate the new plan.

VIII) Target for 2022-23

Under the jurisdiction of Vijayapur Urban Development Authority, the authority has set a new target of constructing a badawane in the partnership of 50:50 with farmers.

Sd/-
Commissioner,
Urban Development Authority, Vijayapur,

URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY, VIJAYAPUR

Sl. No	Annual report to be prepared date	Annual report prepared date	Reason for delay in submission	Annual report given for the printing and received from printing	Date and reference of submission of Annual report to the legislature	Reasons for delay of annual report for submission	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022-2023	March 2023	Submission of Annual Reports is delayed due to delay of printing ,Hence concurrence is solicited	Given for the printing on dated 03-10-2023 and received on dated 30-10-2023	100 booklets and 275 CD's of 2022-2023 annual Report submitted to the Government	Submission of Annual Report is delayed due to delay of printing Hence concurrence is solicited	-

sd/-
Commissioner,
Urban Development Authority, Vijayapur
