

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	604
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು, (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	19-08-2026
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು:	ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ CDP master plan ನಲ್ಲಿ ಇರುವ Alignment ಪ್ರಕಾರ SH-20 ರಸ್ತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೈಪಾಸ್ ದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಂ NH-167 ರಸ್ತೆಗೆ via ಹೊಸೂರು, ಮಲಿಯಬಾದರ ವರೆಗಿನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ CDP ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ Alignment ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರುರವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
ಆ)	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167 ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೂತನ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167ರ (ಹಗರಿ-ಜಡಚೆರಾ) ಸೆಕ್ಷನ್‌ನ ಕಿ.ಮೀ.125.626 ರಿಂದ 182.126 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 56.50 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.180.865 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಭಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28.2.2017ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ Tender cost based ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 06.03.2019 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆ: ತೇಜಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ರೂ.155.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.24.29 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
		ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:07-05-2019 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 06-11-2021 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ Technical Adviser ರವರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2021 ರಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದಾಗಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಬ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇ: ಕೃಷಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07-05-2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ದಿನಾಂಕ:25-3-2022 ರಂದು ಮೇ: ತೇಜಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಮೇ: ಕೃಷಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 30-04-2027 ರ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2026 (ಇ)


 (ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ)
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

KEY-MAP OF RAICHUR CITY

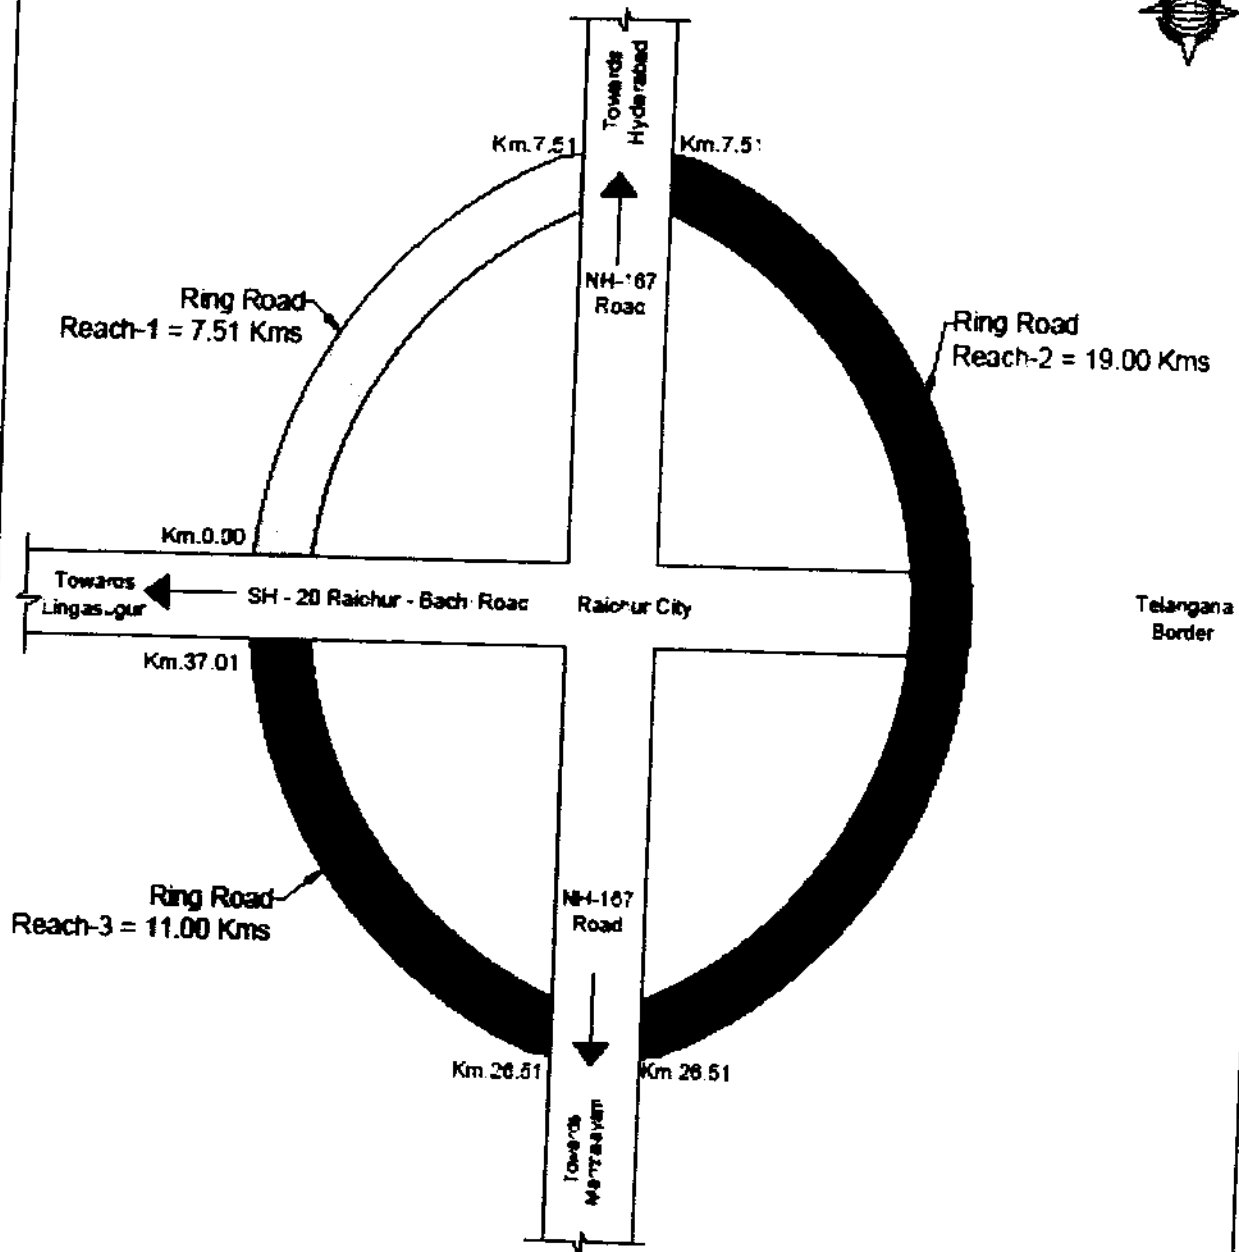

INDEX

- Reach-1 : 7.51 Kms - Already Constructed
- Reach-2 : 19.00 Kms - Not tackled
- Reach-3 : 11.00 Kms - Now Proposed
- Total = 37.51 Kms



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, RAICHUR DISTRICT, RAICHUR-584101
Telephone No: 08532-229011, Fax :08532-229012, Email:dcraichur@gmail.com

DATE: 08-13-2025.

[Handwritten signature]
